

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки 09.03.04 «Программная инженерия» –

Системное и прикладное программное обеспечение

Отчёт

По лабораторной работе №3

Экономика программной инженерии

Вариант: <https://horoscopes.rambler.ru/>

Выполнили:

студенты 3 курса

Батманов Даниил Евгеньевич

Разинкин Александр Владимирович

Сафонова Ольга Данииловна

Группа: Р3407

Принял:

Гаврилов Антон Валерьевич

Отчёт принят «__»_____2025 г.

Оценка: _____

г. Санкт-Петербург, 2025

Задание


Предложить план действий в ситуации, когда прошло 3/4 срока, запланированного на реализацию проекта, а фактически выполнена только половина задач:

1. Определить, какие функции на данный момент еще не завершены и оценить, реализацию каких из них можно отложить для того, чтобы не сдвигать срок выпуска устраивающего заказчика работоспособного продукта с максимальной сохраненной функциональностью.
2. Оценить возможность увеличения команды разработчиков для соблюдения сроков проекта, либо попытаться оптимизировать план работ

Вариант

<https://horoscopes.rambler.ru/>

Метод критического пути:

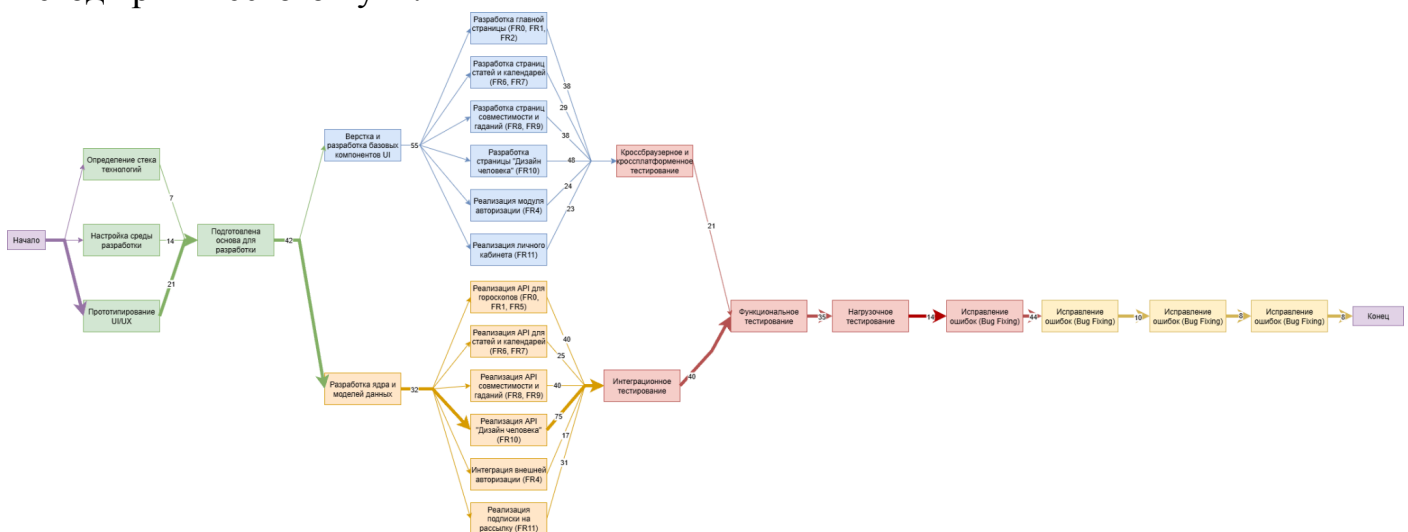

Выделили ключевые точки проекта перед этапом разработки, анализ был полностью проведен:

- 1) Ядро backend (схема базы данных, базовые end-point'ы)
- 2) Базовые компоненты UI
- 3) API Гороскопов + страница UI
- 4) Авторизация
- 5) Рекламные интеграции
- 6) Реализация статей по аналогии с реализацией гороскопов

Без данной функциональности у проекта не было бы смысла, поэтому это мы успели реализовать в первую очередь. Затем перешли к второстепенным задачам.

На момент $\frac{3}{4}$ цикла, выполнена половина работ:

- 1) Составлены нормативно-правовые акты приемки-сдачи работ, документация и требования
- 2) Ключевые задачи разработки (см. выше)
- 3) Проведено smoke-тестирование MVP-проекта
- 4) Проведено интеграционное тестирование MVP-проекта

Для $\frac{3}{4}$ потраченных ресурсов на работу, нам не хватает выполнения следующих пунктов:

- 1) Начало проведение нагрузочного тестирования
- 2) Начало развертывания и тестирования проекта на среде Клиента
- 3) Окончание работ по разработке игр и функциональности “Дизайн человека”
- 4) Функциональное тестирование игр и “Дизайна человека”
- 5) Кросс-браузерное тестирование
- 6) Тестирование UI
- 7) Окончание работ по исправлению ошибок MVP-тестирования
- 8) Подготовка документации для Клиента и Пользователей

Варианты, как разрешить ситуацию:

- 1) Отказаться от нагрузочного тестирования: проект и так не подразумевал высокой нагрузки
- 2) Произвести перераспределение задач между разработчиками в соответствии с квалификацией: более простые и поверхностные задачи передать младшим разработчикам, опытным - наоборот
- 3) По возможности произвести временную ротацию сотрудников: заменить менее опытных более квалифицированными
- 4) Согласовать с Клиентом возможность сделать временные заглушки второстепенного функционала: выпустить проект с уже готовым функционалом, а остальное пометить “в процессе разработки” (например, игры)
- 5) Согласовать с Клиентом возможность тестирования силами Клиента
- 6) Выпустить проект под версией “beta”
- 7) Согласовать с Клиентом долговременную поддержку проекта
- 8) Привлечь к разработке опытных разработчиков с других проектов
- 9) Начать развертывание проекта на среде заказчика
- 10) Согласовать с Клиентов возможное увеличение бюджета для развития сторонних фич (например, дополнительных игр)

Выводы

Удалось подготовить варианты решения проблемы некорректной оценки сроков и сил команды. Предоставить, что мы уже имеем (ориентируясь на ключевые задачи из оценки методом PERT), определить, что осталось сделать, как скорректировать план, чтобы уложиться в текущие сроки.
